

SEMIVA
CHILE SPA



CENTINELA
ANTOFAGASTA MINERALS

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE: INFORME DE VALIDACIÓN



	ELBORADO POR:	REVISADO POR:	VALIDADO POR:
ENCARGADO:	HERBERT FLORES YERBA	JOSE CHICATA MOSCOSO	LUIS SILVA VASQUEZ
CARGO:	SUPERVISOR OPERATIVO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	GERENTE DE OPERACIONES
FIRMA:			
FECHA:	/08/2026	/08/2026	/08/2026

CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. CUMPLIMIENTO MECÁNICO SOBRE ACTIVIDADES 4
3. PROGRAMA DEL SERVICIO 6
   3.1. ITINERARIO DEL SERVICIO: 6
   3.2. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN: 7
   3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 8
4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 9
   4.1. ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PREPARATIVOS 9
   4.2. ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PARADA 11
5. ANEXOS 20
   5.1. DIAGRAMAS 20
   5.2. PROTOCOLOS 22
6. LISTA DE COMPONENTES 23
7. LISTA DE HERRAMIENTAS GENERAL 23
8. LISTA DE CONSUMIBLES 24
9. CONCLUSIONES 25
10. RECOMENDACIONES 25

1. **OBJETIVO**

El objetivo del presente informe técnico es exponer de forma clara y detallada las actividades realizadas de forma secuencial y/o paralela en el servicio de **"INFORME DE VALIDACIÓN"**, en el área REMOLIENDA / CELDAS COLUMNARES – SUL de la Planta concentradora de Minera Centinela, en el presente documento también se expondrán las interferencias, hallazgos, técnicas, recursos utilizados y mejoras identificadas para lograr concluir el trabajo sin observaciones.

- **OBJETIVO PRINCIPAL**


Registrar y sustentar el cumplimiento del servicio de mantenimiento en Cajón Alimentación 322ZM301, detallando actividades, desviaciones/interferencias y evidencias de control, con el fin de respaldar la conformidad del trabajo ejecutado según planificación y estándares de minera Centinela.

2. **CUMPLIMIENTO MECÁNICO SOBRE ACTIVIDADES**

El presente informe es un entregable del trabajo asignado en la carta Gantt emitida a SEMIVA CHILE SPA, el cual está constituido por un conjunto de trabajos que se han culminado.

El presente informe contiene las siguientes referencias:

TAG	OT	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
-	4881375	Cajón Alimentación 322ZM301	0%

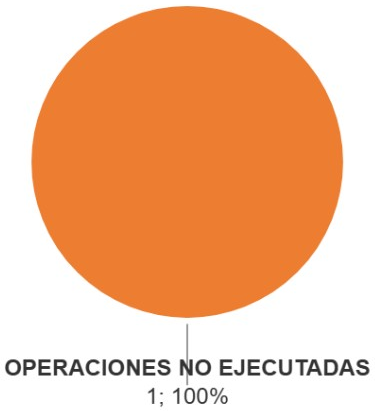

ÁREA:	REMOLIENDA / CELDAS COLUMNARES – SUL	
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS CENTINELA:	-	
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS SEMIVA CHILE SPA:	JOSE DAVID CHICATA MOSCOSO	
SUPERVISOR MECÁNICO DE CENTINELA:	**DÍA:**	Nueva parada
	NOCHE:	
JEFE DE TERRENO DE SEMIVA:	**DÍA:**	HAROLD BARREROS
	NOCHE:	JOSE LUIS GUTIERREZ
SUPERVISOR DE SEMIVA CHILE SPA:	**DÍA:**	
	NOCHE:	

PROGRAMA DEL SERVICIO

3.1. ITINERARIO DEL SERVICIO:

El horario establecido para el servicio de **"INFORME DE VALIDACIÓN"** se ha cumplido rigurosamente durante la etapa de preparativos, parada y post parada; gestionando los recursos necesarios para cuidar el descanso del personal de transporte, cubrir los turnos operativos y respectivos relevos y atender la alimentación y descanso del personal operativo.

FECHA	TURNO	HR. INGRESO A PLANTA	HR. SALIDA DE PLANTA	HRS. PROGRAMADAS	HRS. EFECTIVAS
11/08/2026	B	08:00 PM	08:00 AM	12 Hrs	12 Hrs
12/08/2026	A	08:00 AM	08:00 PM	12 Hrs	12 Hrs
12/08/2026	B	08:00 PM	08:00 AM	12 Hrs	12 Hrs
13/08/2026	A	08:00 AM	08:00 PM	12 Hrs	12 Hrs
13/08/2026	B	08:00 PM	08:00 AM	12 Hrs	12 Hrs
14/08/2026	A	08:00 AM	08:00 PM	12 Hrs	12 Hrs
14/08/2026	B	08:00 PM	08:00 AM	12 Hrs	12 Hrs
15/08/2026	A	08:00 AM	08:00 PM	12 Hrs	12 Hrs
15/08/2026	B	08:00 PM	08:00 AM	12 Hrs	12 Hrs
16/08/2026	A	08:00 AM	08:00 PM	12 Hrs	12 Hrs

3.2. **DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN:**

El cuadro de poblamiento solicitada en el Workpack SEMIVA CHILE SPA del servicio asignado de **"INFORME DE VALIDACIÓN"** se ha cumplido al 100% con los perfiles y cantidades establecidos para cada etapa del trabajo.

3.3. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:**

En base a la Carta Gantt de SEMIVA CHILE SPA se estable un cronograma de partida para la ejecución de todos los servicios y de acuerdo al avance de la ejecución del servicio es que se sinceran los tiempos y actividades realizadas para cumplir con la ejecución del 100% del trabajo sin observaciones, en esta parte identificamos interferencias directas e indirectas, oportunidades de mejora y lecciones aprendidas que serán compartido con el equipo.

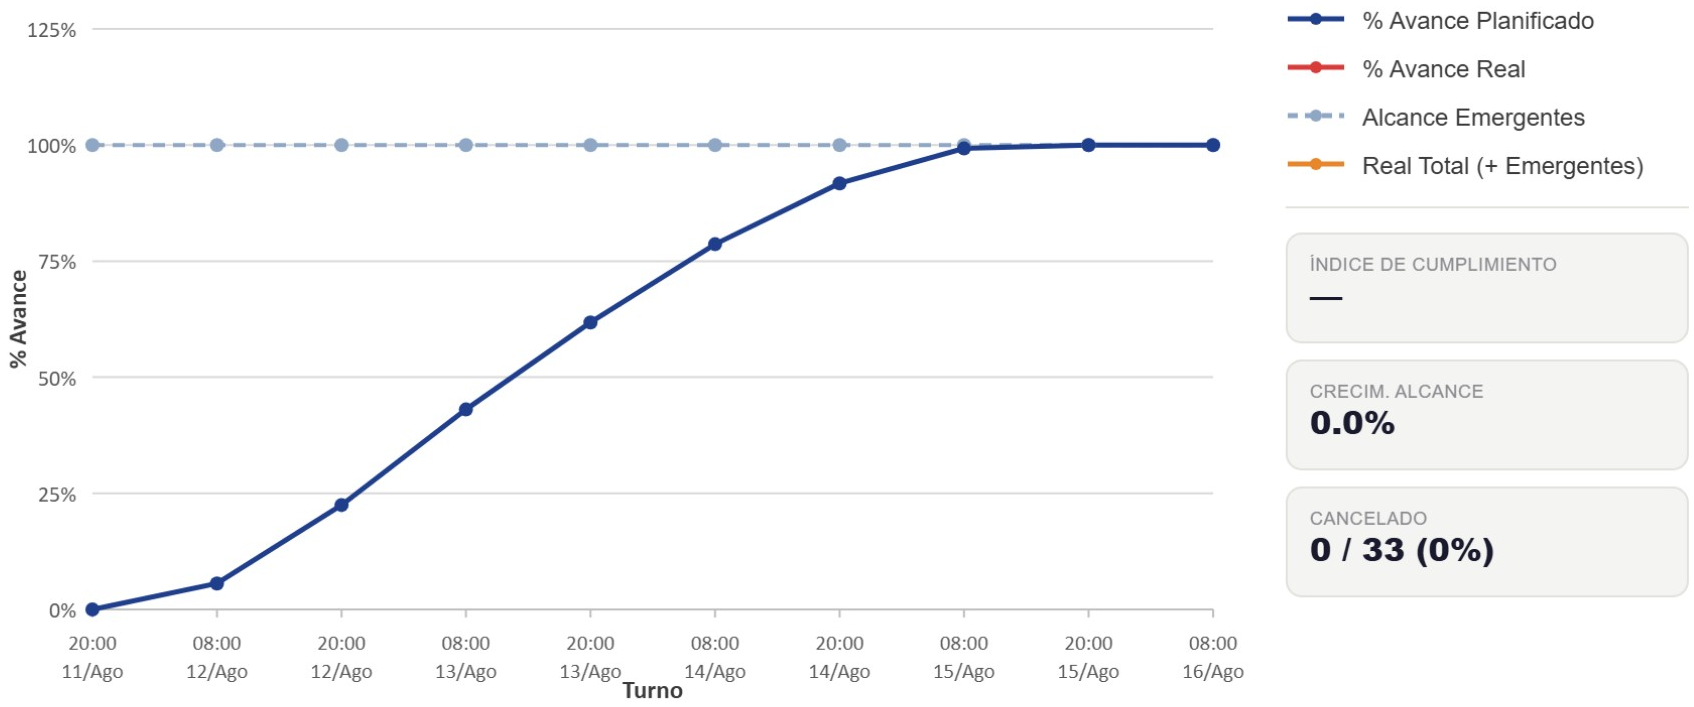


GRÁFICO 2. CURVA "S" DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

4. **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

4.4. **ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PREPARATIVOS**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PERIODO DE PREPARATIVOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN PERIODO DE PREPARATIVOS

4.5. **ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PARADA**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PERIODO DE PARADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN PERIODO DE PARADA

5. **ANEXOS**

6. **LISTA DE COMPONENTES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

7. **LISTA DE HERRAMIENTAS GENERAL**

De acuerdo a las actividades realizadas en previos y parada, se establece una lista general de herramientas y equipos que se utilizaron en la ejecución del servicio, las cuales son independientes por grupo de trabajo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

8. **LISTA DE CONSUMIBLES**

ITEM	DESCRIPCIÓN

9. **CONCLUSIONES**

Habiendo concluido con el servicio de **"INFORME DE VALIDACIÓN"**, según lo planif icado y dispuesto por **MCEN** se concluye lo siguiente.

ÍTEM	CONCLUSIONES
01.	**OT: 4881375 | CAJÓN ALIMENTACIÓN 322ZM301** La actividad quedó con un avance de 0% al cierre del periodo.

10. **RECOMENDACIONES**

Habiendo concluido con el servicio de **"INFORME DE VALIDACIÓN"**, según lo planif icado y dispuesto por **MCEN** se recomienda lo siguiente.

ÍTEM	RECOMENDACIONES
